

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๕๔/๒๕๖๗

ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดย นายชนกฤต อัดทะสัมปณณะ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ผู้รับมอบอำนาจ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๑๐๔๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ทรัพย์สุวรรณ มหาศาล จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสระบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๕๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โดย นางสาววิญญูตา คงเจริญวุฒิ (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสระบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สป.๐๐๔๗๔๖ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยาง (ซอยคำหล้าพัฒนา) หมู่ที่ ๘ ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๕๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้อนุมัติให้ตัดลดงานช่วงที่ ๒ กม. ๐+๐๐๐ ถึง กม. ๐+๖๐๐ ยาว

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายชนกฤต อัดทะสัมปณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาววิญญูตา คงเจริญวุฒิ)

ผู้รับมอบอำนาจ



๖๐๐.๐๐ เมตร ตามแบบรูปราขการและสัญญาจ้างก่อสร้าง กำหนด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๖๐๐ เมตร ไม่มีไหล่ทาง หนา ๐.๐๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๓,๐๐๐ ตารางเมตร ปรับลดลงเหลือ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ไม่มีไหล่ทาง หนา ๐.๐๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร โดยมีรายการที่ตัดลดจำนวน ๑๐ รายการ ดังนี้

๑. งานถางป่าและขุดคอ ขนาดหนัก (Clearing and Grubbing) ตามแบบรูปราขการและสัญญาจ้าง กำหนด ๕,๒๐๐ ตารางเมตร เป็นเงิน ๓๕,๐๐๕.๔๘ บาท **ปรับลดลงเหลือ ๔,๐๐๐ ตารางเมตร เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท**

๒. งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา ๑๐ ซม. (Scarification & Reconstruction of Existing Subbase) (ชั้นรองพื้นทางวัสดุวมรวม) ตามแบบรูปราขการและสัญญาจ้างก่อสร้าง กำหนด ๑๓,๐๐๐ ตารางเมตร เป็นเงิน ๑๕๓,๖๓๑.๔๕ บาท **ปรับลดลงเหลือ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร เป็นเงิน ๑๔๘,๕๐๐.๐๐ บาท**

๓. งานขยายชั้นรองพื้นทางวัสดุวมรวม (Soil Aggregate Subbase) ตามแบบรูปราขการและสัญญาจ้าง ก่อสร้าง กำหนด ๕๗๒ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๒๘๕,๕๗๓.๕๓ บาท **ปรับลดลงเหลือ ๔๔๐ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๒๑๕,๕๗๘.๐๐ บาท**

๔. งานพื้นทางหินคลุก (Crushed Rock Soil Aggregate Type Base) ตามแบบรูปราขการและสัญญาจ้าง ก่อสร้าง กำหนด ๒,๐๓๘ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๑,๑๗๒,๔๓๑.๑๐ บาท **ปรับลดลงเหลือ ๑,๕๖๗.๖๕๒ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๕๐๑,๘๗๗.๗๑ บาท**

๕. งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ด (Prime Coat) (พื้นทางหินคลุก) ตามแบบรูปราขการและสัญญาจ้าง ก่อสร้าง กำหนด ๑๓,๐๐๐ ตารางเมตร เป็นเงิน ๕๓๓,๘๑๔.๐๖ บาท **ปรับลดลงเหลือ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร เป็นเงิน ๔๑๐,๖๐๐.๐๐ บาท**

๖. งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา ๕ ซม. (Asphalt Concrete Wearing Course) ตามแบบรูป ราขการและสัญญาจ้างก่อสร้าง กำหนด ๑๓,๐๐๐ ตารางเมตร เป็นเงิน ๔,๐๓๕,๖๔๑.๓๕ บาท **ปรับลดลงเหลือ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร เป็นเงิน ๓,๑๐๔,๓๐๐.๐๐ บาท**

๗. ป้ายจราจรแบบ ต-๗๖ ตามแบบรูปราขการและสัญญาจ้างก่อสร้าง กำหนด ๒ ชุด เป็นเงิน ๖,๗๕๓.๐๐ บาท **ปรับลดลงเหลือ ๑ ชุด เป็นเงิน ๓,๓๗๖.๕๐ บาท**

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายธนภฤต อัดทะสัมปณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาววิรัชฎา ศรีธรรมวิฑูฒิ)

ผู้รับมอบอำนาจ



๘. สัญญาไฟฟ้าระบบโซล่าเซลล์ ตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้างก่อสร้าง กำหนด ๒ ชุด เป็นเงิน ๓๘,๘๘๔.๒๓ บาท **ปรับลดลงเหลือ ๐ ชุด**

๙. สัญญาไฟฟ้าระบบโซล่าเซลล์ + ป้าย บ ตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้างก่อสร้าง กำหนด ๒ ชุด เป็นเงิน ๔๖,๓๔๕.๒๐ บาท **ปรับลดลงเหลือ ๑ ชุด เป็นเงิน ๒๓,๑๗๒.๖๐ บาท**

๑๐. สัญญาจ้างช่างติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์+สวิตซ์ ตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้างก่อสร้าง กำหนด ๖๔๕ ตารางเมตร เป็นเงิน ๒๕๔,๖๖๗.๒๑ บาท **ปรับลดลงเหลือ ๕๑๐ ตารางเมตร เป็นเงิน ๒๐๑๓๖๓.๓๐ บาท**

รวมเป็นวงเงินที่ปรับลดจำนวน ๑,๕๖๓,๕๘๒.๕๘ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันห้าร้อยแปดสิบสองบาทห้าสิบแปดสตางค์)

คงเหลือเป็นวงเงินตามสัญญาทั้งสิ้นจำนวน ๕,๒๒๖,๔๑๗.๔๒ บาท (ห้าล้านสองแสนสองหมื่นหกพันสี่ร้อยสิบเจ็ดบาทสี่สิบสองสตางค์)

ข้อ ๔. ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๖,๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๔๔๔,๒๐๕.๖๑ บาท (สี่แสนสี่หมื่นสี่พันสองร้อยห้าบาทหกสิบเอ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๖,๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานถางป่าและขุดต่อ ขนาดหน้า
- งานขุดรื้อคันทางเดิม และบดทับ
- งานขยายชั้นรองพื้นทาง และชั้นพื้นทาง
- งานปูผิวจราจร Asphalt Concrete ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายธนภุต อัดทะสัมปณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาววิญญูตา.....)

ผู้รับมอบอำนาจ



- งานเครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์ความปลอดภัยทั้งหมดแล้วเสร็จ

- เก็บทำความสะอาด บริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐, ติดตั้งเครื่องหมายจราจร, ป้ายโครงการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๕,๒๒๖,๔๑๗.๔๒ บาท (ห้าล้านสองแสนสองหมื่นหกพันสี่ร้อยสิบเจ็ดบาทสี่สิบสองสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๔๑,๕๑๕.๑๖ บาท (สามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสิบห้าบาทสิบหกสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๕,๒๒๖,๔๑๗.๔๒ บาท (ห้าล้านสองแสนสองหมื่นหกพันสี่ร้อยสิบเจ็ดบาทสี่สิบสองสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานวางป่าและขุดต่อ ขนาดหนัก

- งานขุดรื้อคันทางเดิม และบดทับ

- งานขยายชั้นรองพื้นทาง และชั้นพื้นทาง

- งานปูผิวจราจร Asphalt Concrete ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานเครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์ความปลอดภัยทั้งหมดแล้วเสร็จ

- เก็บทำความสะอาด บริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐, ติดตั้งเครื่องหมายจราจร, ป้ายโครงการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ข้อ ๑๗. ค่าปรับ

ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑๖,๕๗๕.๐๐บาท (หนึ่งหมื่นหก

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายธนภฤต อัดตะสัมปณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับ

(นางสาววิริญญาดา

ผู้รับมอบอำนาจ



พันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อ
หนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ-..... บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้
จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างขอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้าง
ทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติ
ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียก
ร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวัน
บอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

แก้ไขใหม่เป็น

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้
บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑๓,๐๖๖.๐๔ บาท (หนึ่งหมื่นสาม
พันหกสิบหกบาทสี่สตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อ
หนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ-.... บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้
จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างขอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้าง
ทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติ
ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียก
ร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวัน
บอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาโครงการดังกล่าว เป็นไปตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ซึ่งไม่ทำให้
ทางราชการเสียหาย โดยรายละเอียดอื่นตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๕๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗
คงเดิม

ผู้รับจ้างยินยอมและไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ที่ได้ดำเนินการไปแล้วหรือสิทธิในการฟ้อง
ร้องทางศาลไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายธนภุต อัดทะสัมปณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวจริญญา คางเจริญวุฒิ)

ผู้รับมอบอำนาจ




สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) นี้ ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน
คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ
ต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง

(นายชนกฤต อัดตะสัมปณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง


(นางสาววิริญญา คงเจริญวุฒิ)

(ผู้รับมอบอำนาจ)

(ลงชื่อ)..........พยาน

(นางตะอองดาว บำรุงญาติ)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

(ลงชื่อ)..........พยาน

(นางนาฎยา ทองขาว)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

รายละเอียดแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑๗ หน้า

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(.....นายธนภุต อัครสัมปณณะ.....)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(.....นางสาววิมลรัตน์ คงเจริญรัตน์.....)
ผู้รับมอบอำนาจ



ลงชื่อ.....พยาน
(...นางละอองดาว บำรุงญาติ...)
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

ลงชื่อ.....พยาน
(.....นางนภญา ทองขาว.....)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักช่าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง โทร.๐-๓๖๒๑-๔๐๙๐

ที่ สบ ๕๑๐๐๕.๑/๖๕๖๖

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอแก้ไขสัญญาจ้างสัญญาจ้างเลขที่ ๑๕๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ผ่าน ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๙๔๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ และคำสั่งฯ ที่ ๒๖๔๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง เลขที่ ๑๕๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดตามบันทึกข้อความ ที่ สบ ๕๑๐๐๕.๑/ ลงวันที่ ตุลาคม ๒๕๖๗ ที่แนบมาด้วยนี้

โครงการฯ มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง โดยการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้อนุมัติแก้ไขสัญญาตัดลดงานช่วงที่ ๒ กม. ๐+๐๐๐ ถึง กม. ๐+๖๐๐ ยาว ๖๐๐.๐ ม. จำนวน ๑๐ รายการ คิดเป็นมูลค่างานที่ลดลงจำนวน ๑,๕๖๓,๕๘๒.๕๘ บาท คงเหลือมูลค่างานก่อสร้าง ๕,๒๒๖,๔๑๗.๔๒ บาท หลังตัดลดงานแล้วมีรายละเอียดโครงการฯ เป็นขนาด ผิวดรจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. ไม่มีไหล่ทาง หนา ๐.๐๕ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตร.ม. และผู้รับจ้างยินยอมดำเนินการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม รายละเอียดการยินยอมตามหนังสือ บริษัท ทรัพย์สุวรรณ มหาศาล จำกัด ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2567 ที่แนบมาด้วยนี้

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้เว้นแต่ในกรณี ดังต่อไปนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้

(๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายในขอบข่าย แห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้น ก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

เมื่อผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น

จึงขอให้ดำเนินการแก้ไขสัญญา ตามรายละเอียดข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นางทิตยาพร เพชรประดับ)
ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ

(นางสรารัตน์ สุขมะดัน)
กรรมการตรวจรับพัสดุ

(นายจิรพล บุญลือ)
กรรมการตรวจรับพัสดุ

เอกสารแนบที่ ๑	หน้า ๑๘๐
สำนักช่าง อบจ.สระบุรี	เลขที่รับ รับที่ 30/๑๑/๖๗
ควบคุมการก่อสร้าง	เวลา
- ฝ่ายสำรวจ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ส่วนการโยธา
- ฝ่ายออกใบ <input type="checkbox"/>	- ฝ่ายสาธารณูปโภค <input type="checkbox"/>
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป <input type="checkbox"/>	- ฝ่ายเครื่องจักรกล <input type="checkbox"/>
	- ฝ่ายช่างสุขาภิบาล <input type="checkbox"/>

บริษัท ทรัพย์สุวรรณ มหาสาร จำกัด

55 หมู่ 5 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240

วันที่ 30 ตุลาคม 2567

เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ

- อ้างถึง 1. สัญญาจ้างเลขที่ 154/2567 ลงวันที่ 23 เมษายน 2567
2. หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ 51005/4843 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2567
- ตามเอกสารที่อ้างถึงหมายเลข 2 ผู้รับจ้างยินยอมดำเนินการแก้ไขสัญญาและปรับลดค่างานจ้างก่อสร้าง โดยตัดลดงานช่วงที่ 2 กม. 0+000 ถึง กม. 0+600 ยาว 600.0 ม. จำนวน 10 รายการ คิดเป็นมูลค่างานที่ลดลงจำนวน 1,563,582.58 บาท คงเหลือมูลค่างานก่อสร้าง 5,226,417.42 บาท หลังตัดลดงานแล้วมีรายละเอียดโครงการฯ เป็นขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 2,000 ม. ไม่มีไหล่ทาง หน้า 0.05 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 10,000 ตร.ม.

ขอแสดงความนับถือ



(นายธรรมรัตน์ อังกิตานนท์)

ผู้จัดการ

สำเนาฉบับ

ที่ สบ ๕๑๐๐๕/๕/๕๗

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ถนนพหลโยธิน สบ. ๑๘๐๐๐

๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอแก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ ๑๕๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรัพย์สุวรรณ มหาศาล จำกัด

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ ๑๕๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. เอกสารคำนวณราคางานเพิ่ม-ลด

จำนวน ๑ ฉบับ

๒. แบบแปลนแก้ไข

จำนวน ๑ ชุด

ตามสัญญาที่อ้างถึง โครงการฯ พบปัญหาและอุปสรรค ไม่สามารถก่อสร้างถนนช่วงที่ ๒ กม. ๐+๐๐๐ ถึง กม. ๐+๖๐๐ ยาว ๖๐๐.๐ ม. ตลอดช่วงได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างพิพาทแนวเขตทางกับแนวเขตที่ดินของประชาชนข้างเคียง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี แก้ไขปัญหาและอุปสรรคโดยขอแก้ไขสัญญาดังกล่าวฯ ตัดลดงานช่วงที่ ๒ กม. ๐+๐๐๐ ถึง กม. ๐+๖๐๐ ยาว ๖๐๐.๐ ม. จำนวน ๑๐ รายการ คิดเป็นมูลค่างานที่ลดลงจำนวน ๑,๕๖๓,๕๘๒.๕๘ บาท คงเหลือมูลค่างานก่อสร้าง ๕,๒๒๖,๔๑๗.๔๒ บาท หลังตัดลดงานแล้วมีรายละเอียดโครงการฯ เป็นขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. ไม่มีไหล่ทาง หนา ๐.๐๕ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตร.ม. รายละเอียดการคำนวณราคางานเพิ่ม-ลด และแบบแปลนแก้ไข ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข ๑ และหมายเลข ๒ ตามลำดับ หากผู้รับจ้างยินยอมดำเนินการแก้ไขสัญญา ตามรายละเอียดข้างต้น โปรดแจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีทราบ เพื่อจะได้ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนภฤต อัดทะสัมปณณ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

สำนักช่าง

ส่วนควบคุมการก่อสร้าง

โทร ๐-๓๖๒๑-๔๐๙๐

โทรสาร ๐-๓๖๒๑-๔๐๙๐

.....รองนายกองค์การฯ
.....ปลัดองค์การฯ
.....รองปลัดองค์การฯ
.....ผอ.สำนักช่าง
.....ผอ.ส่วนฯ
.....หน.ฝ่ายฯ
.....*มานิตชัย* เจ้าหน้าที่
.....*มานิตชัย* พิมพ์/ทาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักช่าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง โทร. ๐-๓๖๒๑-๔๐๙๐

ที่ สบ ๕๑๐๐๕.๑/๒๕๖๗

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขสัญญา โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (ซอยคำหล้าพัฒนา) หมู่ที่ ๘ ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความ ที่ สบ ๕๑๐๐๕.๑/- ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗ ผู้ควบคุมงานแจ้งปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (ซอยคำหล้าพัฒนา) หมู่ที่ ๘ ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๕๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ มูลค่างานจ้าง ๖,๗๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท มี บริษัท ทรัพย์สุวรรณ มหาศาล จำกัด เป็นผู้รับจ้าง โดยมีรายละเอียดปัญหาและอุปสรรค คือ ไม่สามารถก่อสร้างถนนช่วงที่ ๒ กม. ๐+๐๐๐ ถึง กม. ๐+๖๐๐ ยาว ๖๐๐.๐ ม. ตลอดช่วงได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างพิพาทแนวเขตทางกับแนวเขตที่ดินของประชาชนข้างเคียง

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ได้ร่วมประชุมพิจารณาในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สถานที่ก่อสร้าง จากการประชุมคณะกรรมการฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค โดยตัดลดงานช่วงที่ ๒ กม. ๐+๐๐๐ ถึง กม. ๐+๖๐๐ ยาว ๖๐๐.๐ ม. จำนวน ๑๐ รายการ คิดเป็นมูลค่างานลดจำนวน ๑,๕๖๓,๕๘๒.๕๘ บาท คงเหลือมูลค่างานก่อสร้างจำนวน ๕,๒๒๖,๔๑๗.๔๒ บาท รายละเอียดการคำนวณปริมาณงานและราคา ตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้ และผู้รับจ้างยินยอมแก้ไขสัญญาตัดลดงาน

ระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้เว้นแต่ในกรณี

ดังต่อไปนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณานุมัติให้แก้ไขได้

(๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุหรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

เมื่อผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น

ข้อพิจารณา

โครงการฯ มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง โดยการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ เห็นควรพิจารณาอนุมัติแก้ไขสัญญาตัดลดงานช่วงที่ ๒ กม. ๐+๐๐๐ ถึง กม. ๐+๖๐๐ ยาว ๖๐๐.๐ ม. จำนวน ๑๐ รายการ คิดเป็นมูลค่างานที่ลดลงจำนวน ๑,๕๖๓,๕๘๒.๕๘ บาท คงเหลือมูลค่างานก่อสร้าง ๕,๒๒๖,๔๑๗.๔๒ บาท โดยหลังตัดลดงานแล้วมีรายละเอียดโครงการฯ เป็นขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. บาว ๒,๐๐๐ ม. ไม่มีไหล่ทาง หนา ๐.๐๕ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่เสาเตี้ยไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตร.ม. และส่งหนังสือแจ้งผู้รับจ้างยินยอมแก้ไขสัญญาตัดลดงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และโปรดลงนามในหนังสือแจ้งผู้รับจ้างที่นำเสนอมาร่วมนี้

(นางทิตยาพร เพชรประดับ)
ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ

(นางสรารัตน์ สุขมะตัน)
กรรมการตรวจรับพัสดุ

(นายจิรพล บุญสี)
กรรมการตรวจรับพัสดุ

(นางทิตยาพร เพชรประดับ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักช่าง

อนุมัติ


(นายชัชชาติ สดลละลิ้ม [สมศรี])
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(นางทิตยาพร เพชรประดับ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
- เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวนิภา ประชีพฉาย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

แก้ไข เอกสารแนบท้ายสัญญาข้อที่ 2.1 หน้า 3
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (ขอยกค่าพัฒนา) หมู่ที่ 8
ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

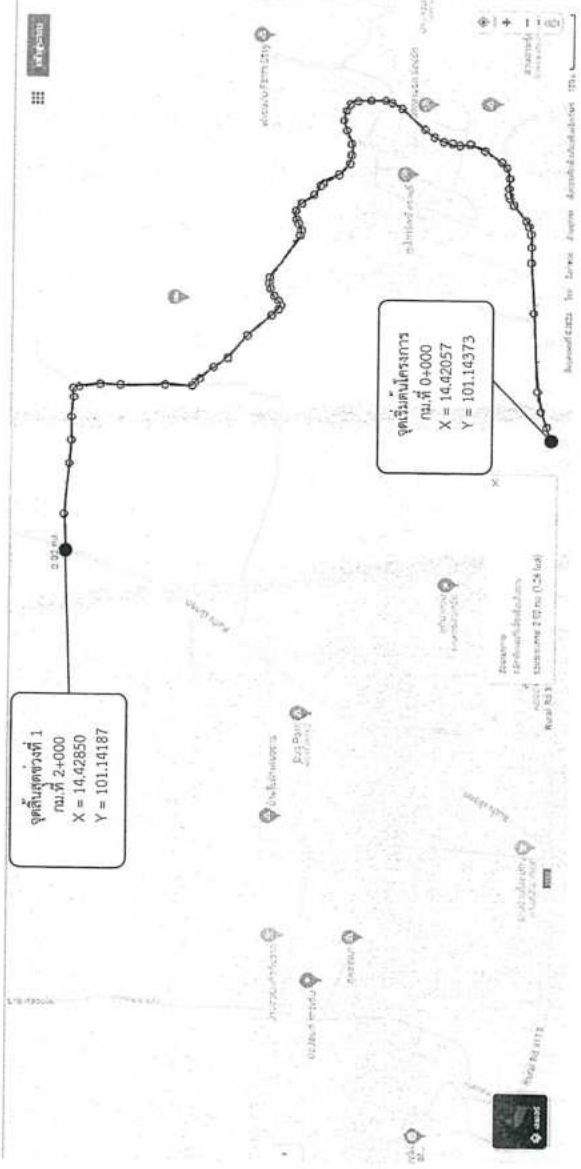

รายละเอียดการประกอบการก่อสร้าง
ก่อสร้างถนนลาดยาง (ขอยกค่าพัฒนา) หมู่ที่ 8 ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.05 เมตร
หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนของสำนักงานบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ 33/66

กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามรูปแบบ และรายละเอียดที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขและกรมการตรวจรับพัสดุ
ผ่านผู้ควบคุมงานเพื่อวิธีอื่น และหาข้อสรุป แต่ยังไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


สารบัญ	
แผนที่	รายการ
1.	ปกแบบ
2.	แผนที่สังเขป รายละเอียด
3.-4.	รายการประกอบแบบ
5.	บัญชีปริมาณงาน
6.	รูปตัดตามขวาง Asphalt concrete
7.-9.	รูปแปลนตามยาว



องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	
โครงการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (ขอยกค่าพัฒนา) หมู่ที่ 8 ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	
ผู้จ้างงาน	(นายเกษมชัย ชูศรีจันทร์) วิศวกรโยธาปฏิบัติกร
ผู้ควบคุมงาน	(นายพงศ์กร เพชรประเสริฐ) วิศวกรโยธาชำนาญการ
กรรมการ	(นายจวิฑฐ พงศ์ศิลป์) หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค
กรรมการ	(นางสรารัตน์ พงษ์ศิลป์) ผู้อำนวยการส่วนการโยธา
ประธาน	(นางศรีศุภพร เพชรประเสริฐ) รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
เห็นชอบ	(นางศุภนิภา เพชรประเสริฐ) รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
เห็นชอบ	(นางสรารัตน์ พงษ์ศิลป์) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อนุมัติ	(นายสมภพ อดิระสิริโกมล) นายก อบจ.สระบุรี
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ปฏิบัติราชการ	
สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	
นางสาว.....	รับมอบให้
นางสาว.....	มอบให้
02	

แก้ไข เอกสารแบบท้ายสัญญาข้อที่ 2.1 หน้า 7

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (ขอยกค่าพัฒนา) หมู่ที่ 8 ตำบลชะอ้อม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 2,000 เมตร

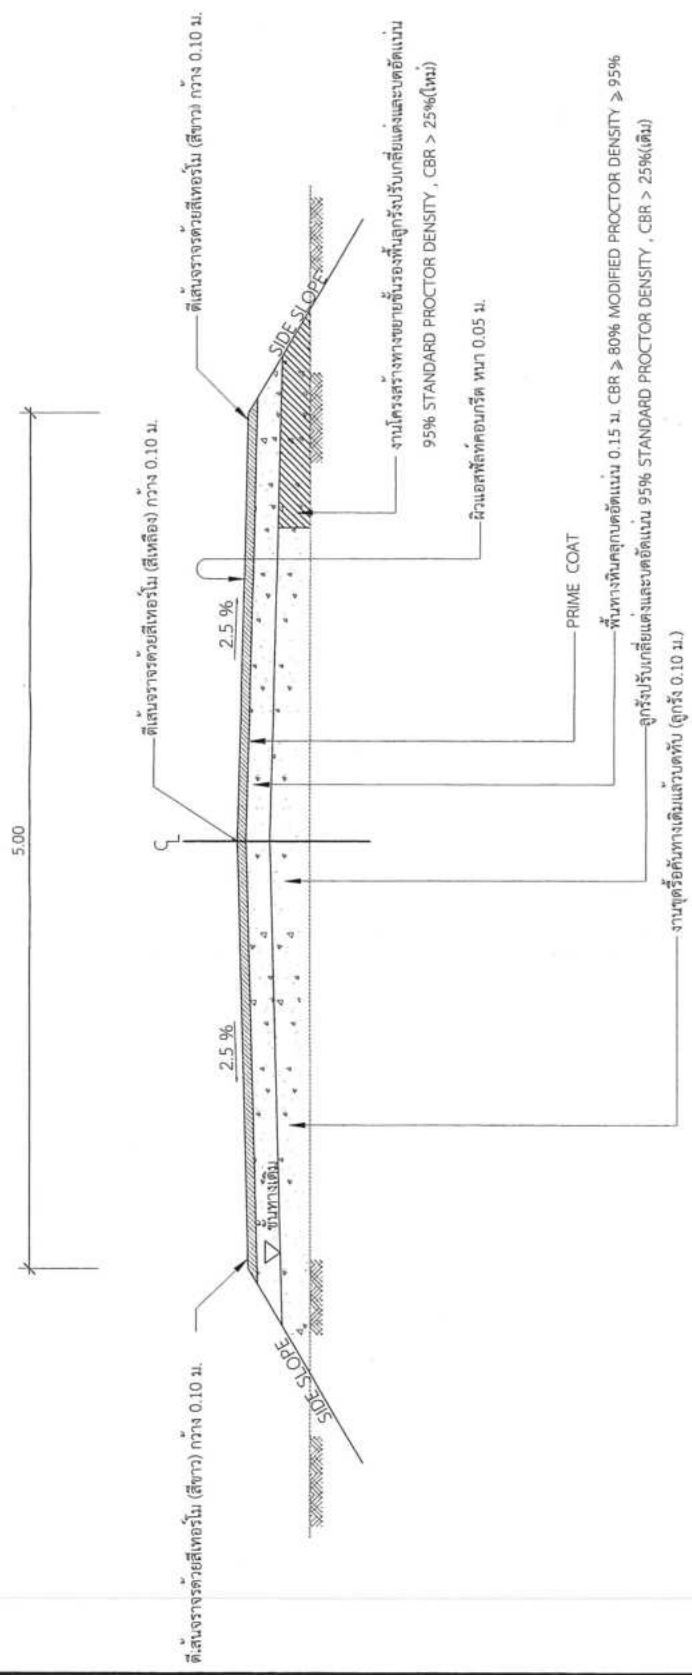

รูปตัดตามขวาง ASPHALT CONCRETE

(ช่วงที่ 1)

หมายเหตุ

- ก่อนเข้าดำเนินการก่อสร้างหรือปรับปรุงถนนผู้รับจ้างจะต้องสำรวจเส้นทางและจัดทำแบบการสำรวจ Shop drawing รูป Profile ระดับดินเดิมและระดับก่อสร้าง, รูป Cross - Section ทุกๆ 25.00 ม. ให้ตรงตามปริมาณงานในใบเสนอราคา และเสนอต่อทางควบคุมงานและ คณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นชอบ ก่อนดำเนินการ
- จุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุด ระยะ มีติ ต่างๆไม่ชัดเจนหรือขัดแย้งให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานและ คณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นชอบ ก่อนดำเนินการ

โครงการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (ขอยกค่าพัฒนา) หมู่ที่ 8 ตำบลชะอ้อม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	
ผู้ควบคุมงาน <i>[Signature]</i> (นายณิคมย์ สุทธิรุ่งโรจน์) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	
ผู้ควบคุมงาน <i>[Signature]</i> (นายพงศ์กร เพชรประเสริฐ) วิศวกรโยธาชำนาญการ	
กรมการฯ <i>[Signature]</i> (นายธีรพงศ์ บุญเรือง) หัวหน้าฝ่ายสาขาวิชาโยธา	
กรมการฯ <i>[Signature]</i> (นายสรารักษ์ สุขะตัน) ผู้บังคับกองกลางกรมการโยธา	
ประธานฯ <i>[Signature]</i> (นายเกียรติพร เพชรประเสริฐ) รองอธิบดีกรมการโยธา	
เห็นชอบ <i>[Signature]</i> (นายเกียรติพร เพชรประเสริฐ) อธิบดีกรมการโยธา	
เห็นชอบ <i>[Signature]</i> (นางสาววิภา ประสิทธิ์ฉาย) ปลัดกรมการโยธา	
อนุมัติ (นายชัชวาล อัครเศษรัมย์) รองอธิบดีกรมการโยธา	
รองนายกรัฐมนตรี รองอธิบดีกรมการโยธา	
นายชัชวาล อัครเศษรัมย์ อธิบดีกรมการโยธา	
วันที่ 06	

รองนายกรัฐมนตรี
รองอธิบดีกรมการโยธา

แก้ไข เอกสารแนบท้ายสัญญาข้อที่ 2.1 หน้า 9





องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

โครงการ
โครงการสร้างถนนลาดยาง (ขุดค้นเก่าพัฒนา)
หมู่ที่ 8 ตำบลระเอย อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี


ผู้ควบคุมงาน	(นายนิยม ชูศรีจันทร์) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ผู้ควบคุมงาน	(นายเชษฐา เพชรประสงค์) วิศวกรโยธาชำนาญการ
กรรมการ	(นายสุวิมล บุญดี) หัวหน้าฝ่ายช่างการโยธา
กรรมการ	(นายสรวิทย์ สุขะรัมย์) ผู้อำนวยการส่วนการโยธา
ประธาน	(นายพิชิตพร เพชรประสงค์) รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
เห็นชอบ	(นายพิชิตพร เพชรประสงค์) รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
เห็นชอบ	(นางสาวนภา ประณีพิทยา) เลขาธิการบริหารจังหวัดสระบุรี
อนุมัติ	(นายธนาภักดิ์ อัครสังข์ประไพ) นายก อบจ. สระบุรี

รองนายก อบจ. สระบุรี
นายก อบจ. สระบุรี

หน้ากระดาษ
ฉบับที่ ๐๘

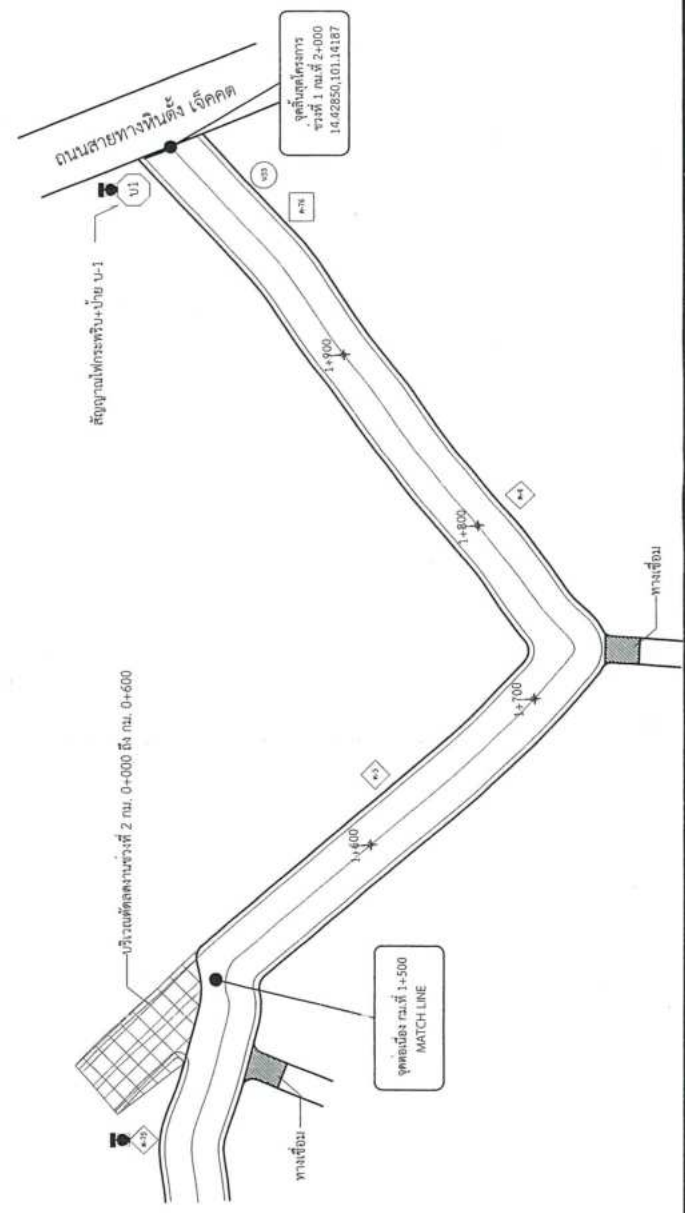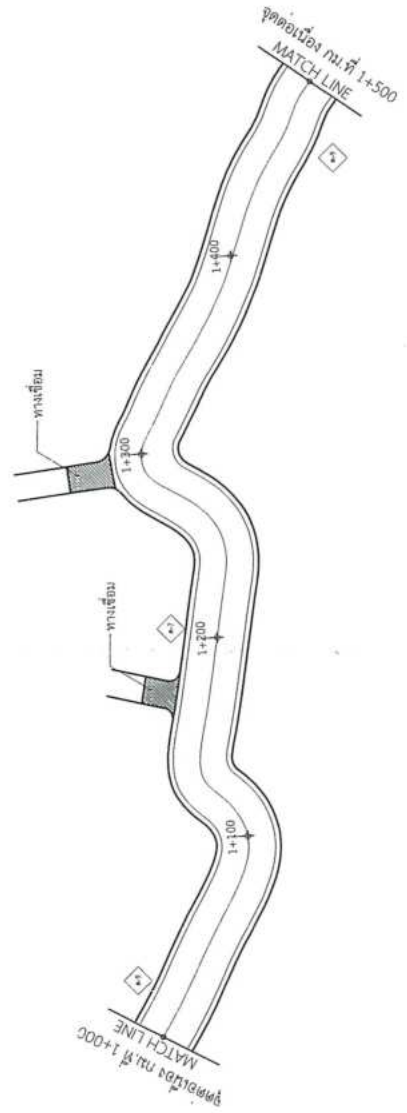

แก้ไข เอกสารแนบท้ายสัญญาข้อที่ 2.1 หน้า 10

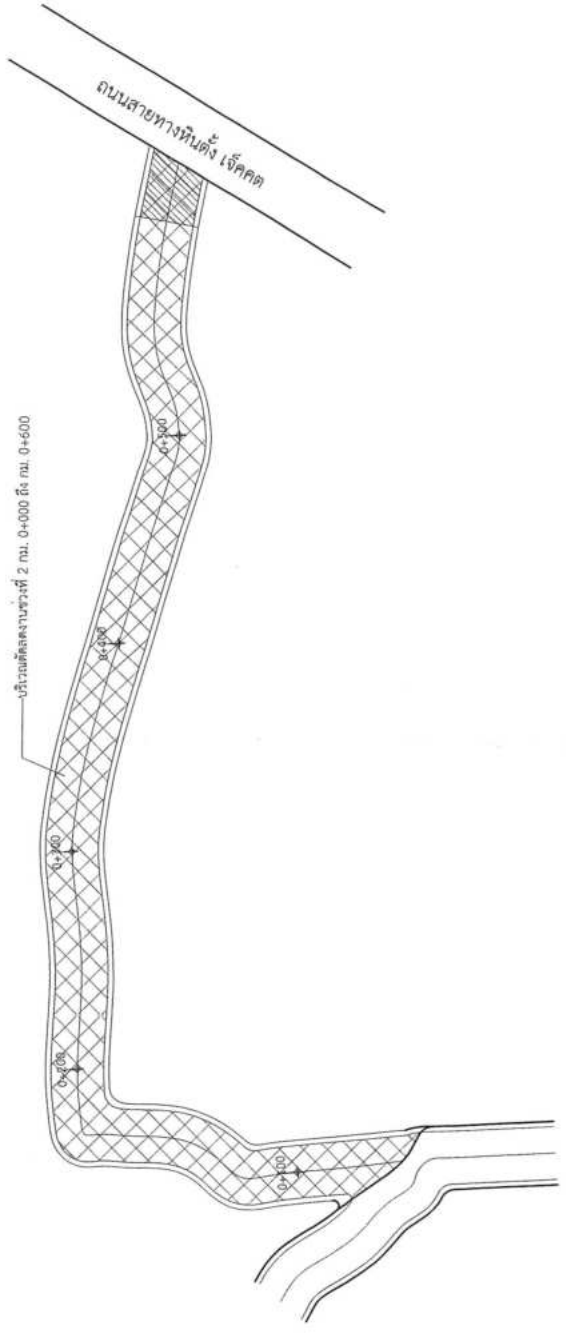

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

โครงการ

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (ขอมสายลำพัฒนา)
หมู่ที่ ๘ ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ผู้ควบคุมงาน	(นายเอกนิติชัย ชูศรีจันทร์) วิศวกรโยธาอาวุโส
ผู้ควบคุมงาน	(นายพงษ์พร เพชรประดับ) วิศวกรโยธาชำนาญการ
กรรมการ	(นายจันทาล บุญเชื้อ) หัวหน้าช่างสำรวจไปรษณีย์
กรรมการ	(นางสาวรพีพร สุจนะพันธ์) ผู้อำนวยการส่วนการโยธา
ประธาน	(นางกัญญาพร เพชรประดับ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เห็นชอบ	(นางกัญญาพร เพชรประดับ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เห็นชอบ	(นางสาววิภา ปะริชิตยา) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อนุมัติ	(นายธนาภฤต อรรถะสัมพันธ์) นายก อบจ. สระบุรี

(นายธนาภฤต อรรถะสัมพันธ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการ

นายก อบจ. สระบุรี

บุคลากร	วันที่
นายธนาภฤต	09
